

ns-Guenter Siemen

Von: Hartmut Lueken <lueken@haaren-wasseracht.de>
Gesendet: Dienstag, 19. Juni 2018 16:43
An: bauenundplanen
Cc: Thorsten Wardenburg; Hobbiebrunken, Jan
Betreff: Stauwand in Ofener Bäke, Metjenweg 1
Anlagen: Metjenweg 1.pdf

Sehr geehrter Herr Siemen,

für die Regelung der Oberflächenentwässerung des Bebauungsplangebietes 78 „Mühlengrund“ wurde 1996/1997 von der Gemeinde Wiefelstede im Bereich Metjenweg 1 in Metjendorf eine Stauwand in die Ofener Bäke eingebaut. Diese Stauwand und insbesondere die angrenzende Böschungssicherung ist inzwischen abgängig und muss erneuert werden.

Als Eigentümer der Anlage obliegt Ihnen die Unterhaltung und Erhaltung des Bauwerkes.

Freundliche Grüße

Hartmut Lueken

Geschäftsführung



Haaren-Wasseracht

Verband für Wasser-, Boden und Landschaftspflege
Sandweg 2 · 26160 Bad Zwischenahn / Petersfehn I

Tel.: 04486 - 66 35 Fax: 04486 - 64 83

E-Mail: lueken@haaren-wasseracht.de | Web: www.haaren-wasseracht.de

Haaren-Wasseracht


Verband für Wasser-, Boden- und
Landschaftspflege

Sandweg 2
Petersfehn I
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: (04486) 6635
E-Mail: info@haaren-wasseracht.de



Maßstab: 1:1.000

19.06.2018

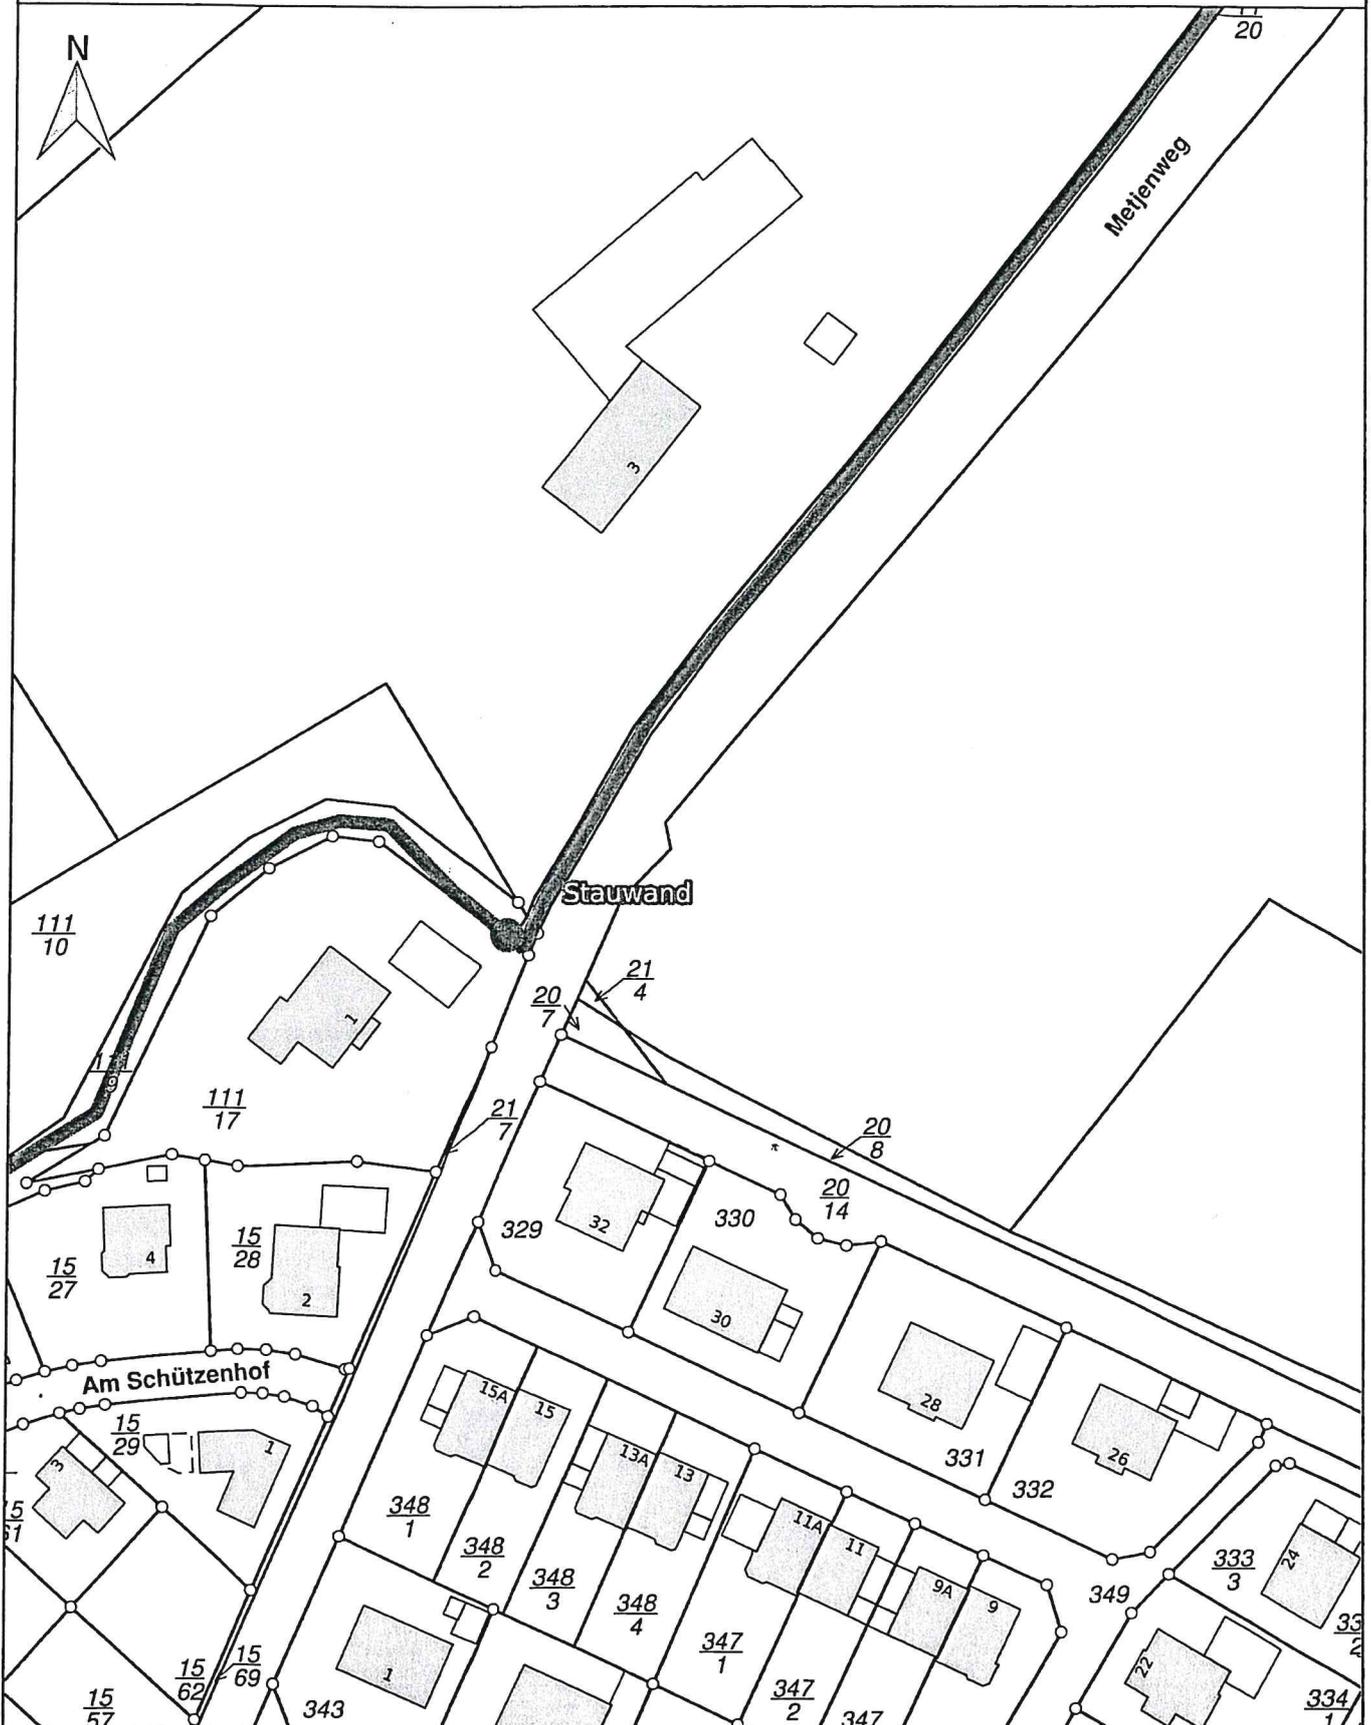

Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Auszüge aus der Liegenschaftskarte sind gesetzlich geschützt. Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nicht gewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4 Nds. Vermessungs- und Katastergesetz vom 02. Juli 1985 Nds. GVBl. S. 187). Der Grundriss ist aus einer Karte kleineren Maßstabs erstellt worden. Die Genauigkeit entspricht nur der geometrischen Qualität der ursprünglichen Karte.

Hans-Guenter Siemen

Von: Hans-Guenter Siemen
Gesendet: Dienstag, 31. Juli 2018 08:18
An: 'Heinrich von Bloh'
Cc: tiefbau
Betreff: AW: Angebot für den Einbau einer neuen Stauwand einschl. Reparaturarbeiten im direkten Umfeld

Hallo Herr von Bloh,

vielen Dank für das Angebot. Wie bereits beim Ortstermin besprochen kann die Auftragsvergabe erst in 2019 erfolgen. Wir werden unaufgefordert wieder auf Sie zukommen.

Mit freundlichen Grüßen
i. A. Hans-Guenter Siemen
Gemeinde Wiefelstede
Fachbereich Bauen und Planen
Kirchstraße 10
26215 Wiefelstede
Tel.: +49 4402 965160
Fax: +49 4402 965299
E-Mail: bauenundplanen@wiefelstede.de
Internet: www.wiefelstede.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Heinrich von Bloh [<mailto:info@heinrichvonbloh.de>]
Gesendet: Montag, 30. Juli 2018 18:33
An: Hans-Guenter Siemen
Cc: tiefbau
Betreff: AW: Angebot für den Einbau einer neuen Stauwand einschl. Reparaturarbeiten im direkten Umfeld

Sehr geehrter Herr Siemen,

vielen Dank für Ihre Anfrage, im Anhang hier unser Angebot für die Herstellung einer neuen Stauwand.

Mit freundlichen Grüßen

Ulf von Bloh

Heinrich von Bloh GmbH
Eichenweg 5
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 0 44 86 / 92 63 -12
Fax: 0 44 86 / 92 63 -20
E-Mail: info@heinrichvonbloh.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Hans-Guenter Siemen <Hans-Guenter.Siemen@wiefelstede.de>

Gesendet: Montag, 30. Juli 2018 15:45

An: info@heinrichvonbloh.de

Cc: tiefbau <tiefbau@wiefelstede.de>

Betreff: WG: Angebot für den Einbau einer neuen Stauwand einschl. Reparaturarbeiten im direkten Umfeld

Hallo Herr von Bloh,

wann erhalte ich voraussichtlich das zugesagte Angebot?

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Hans-Guenter Siemen

Gemeinde Wiefelstede

Fachbereich Bauen und Planen

Kirchstraße 10

26215 Wiefelstede

Tel.: +49 4402 965160

Fax: +49 4402 965299

E-Mail: bauenundplanen@wiefelstede.de

Internet: www.wiefelstede.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Hans-Guenter Siemen

Gesendet: Dienstag, 17. Juli 2018 10:12

An: info@heinrichvonbloh.de

Cc: tiefbau

Betreff: WG: Angebot für den Einbau einer neuen Stauwand einschl. Reparaturarbeiten im direkten Umfeld

Hallo Herr von Bloh,

das Flurstück 111/10 der Flur 29 gehört zum Grundstück Metjenweg 1, Flurstück 111/17 und kann voraussichtlich nicht für eine Befahrung genutzt werden.

Wir bedanken uns für das heutige Gespräch vor Ort und die Zusendung des Angebotes bis Ende Juli 2018.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Hans-Guenter Siemen

Gemeinde Wiefelstede

Fachbereich Bauen und Planen

Kirchstraße 10

26215 Wiefelstede

Tel.: +49 4402 965160

Fax: +49 4402 965299

E-Mail: bauenundplanen@wiefelstede.de

Internet: www.wiefelstede.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: scanner@wiefelstede.de [<mailto:scanner@wiefelstede.de>]

Gesendet: Dienstag, 17. Juli 2018 09:57

An: Hans-Guenter Siemen

Betreff:

TASKalfa 4052ci

Heinrich von Bloh GmbH

Tiefbauunternehmen

Bauherr:

Gemeinde Wiefelstede

Datum: 30.07.2018

Angebot

Stauwand in Metjendorf

Titel	Menge	Einheit	Text	E-Preis	Gesamt
1.3. Spundwand					
1.3.1.	5,50	m	Eichenspundwand d = 8 cm mit Nut und Feder liefern und als Stauwand lotrecht in den Graben rammen. Material: Spundbohlen aus Eiche d = 8 cm, b = 20 cm, L = 250 cm	382,21 €/m	2.102,14 €
1.3.2.	5,50	m	Doppelzange aus Eichenholz 10/ 16 cm liefern und als oberer Abschluss mit Bolzen M 12 fest mit Spundwand verschrauben.	192,20 €/m	1.057,09 €
1.3.3.	1,00	Stück	Einbau des seitlich gelagerten Rahmen der Dammbalken, einschl. Lieferung aller notw. Befestigungsmaterialien.	195,00 €/Stück	195,00 €
1.3. Spundwand					3.354,23 €
1.4. Grabenbefestigung					
1.4.1.	20,00	m ²	Einbau der seitlich gelagerten Wasserbausteinen als Uferbefestigung auf Wasserbauvlies GRK 5.	85,90 €/m ²	1.718,00 €
1.4. Grabenbefestigung					1.718,00 €

Zusammenstellung

Summe Titel 1.	Stauwand in Metjendorf		
	1.1. Vorbereitende Arbeiten	=	1.845,80 €
	1.2. Rückbau der vorh. Wand	=	861,25 €
	1.3. Spundwand	=	3.354,23 €
	1.3. Grabenbefestigung	=	1.718,00 €
	Netto Summe	=	7.779,28 €
	+ 19,00 % MwSt.	=	1.478,06 €
	Angebotssumme (Brutto)	=	9.257,34 €

Hausanschrift:
Petersfehn I
Eichenweg 5
26160 Bad Zwischenahn

Telefon:
(0 44 86) 92 63 - 0
Telefax:
(0 44 86) 92 63 - 20

HRB 120051
Amtsgericht Oldenburg
USt-ID-Nr.: DE117828341

Heinrich von Bloh GmbH

Tiefbauunternehmen

Bauherr:

Gemeinde Wiefelstede

Datum: 30.07.2018

Angebot

Stauwand in Metjendorf

Titel	Menge	Einheit	Text	E-Preis	Gesamt
Titel 1.			Stauwand in Metjendorf		
	1.1.		Vorbereitende Arbeiten		
1.1.1.	1,00	Psch	Baustelle einrichten, aller notw. Geräte während der Bauzeit vorhalten und nach Fertigstellung wieder räumen. Einschließlich Absicherung und Absperrung der Baustelle. Sowie die das Freischeiden des benötigten Arbeitsraum.	1.845,80 €/Psch.	1.845,80 €
	1.1.		Vorbereitende Arbeiten		1.845,80 €
	1.2.		Rückbau der vorh. Wand		
1.2.1.	1,00	Stück	vorh. Stauwand ausbauen und das Holz entsorgen. Dammbalkenrahmen wenn möglich für den Wiedereinbau seitlich lagern.	561,25 €/Stück	561,25 €
1.2.2.	20,00	m ²	vorh. Wasserbausteine der Böschungssicherung aufnehmen, säubern und seitlich für den Wiedereinbau lagern.	9,75 €/m ²	195,00 €
1.2.3.	20,00	m	Aufreinigung des Grabens im Ein- und Auslaufbereich der Staustufe.	5,25 €/m	105,00 €
	1.2.		Rückbau der vorh. Wand		861,25 €

Hausanschrift:
Petersfehn I
Eichenweg 5
26160 Bad Zwischenahn

Telefon:
(0 44 86) 92 63 - 0
Telefax:
(0 44 86) 92 63 - 20

HRB 120051
Amtsgericht Oldenburg
USt-ID-Nr.: DE117828341
